1150 WIEN, Diefenbachgasse 36 - BAUZEITPLAN- Stand: 14.05.07

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1	**Baustellengemeinkosten**	**210t**	**Mon 12.11.07**	**Die 23.09.08**
2	Baustelleneinrichtung	5t	Mon 12.11.07	Fre 16.11.07
3	Vorhaltung Rohbau	105t	Mon 19.11.07	Mon 28.04.08
4	Vorhaltung Ausbau	75t	Die 29.04.08	Die 19.08.08
5	Baustellenräumung	5t	Mit 20.08.08	Die 26.08.08
6	Baureinigung	10t	Mit 20.08.08	Die 02.09.08
7	Gesamtfertigstellung	0t	Die 02.09.08	Die 02.09.08
8		15t	Mit 03.09.08	Die 23.09.08
9	**DG-Diefenbachgasse**	**63t**	**Mon 19.11.07**	**Mit 27.02.08**
10	Ziegelpfl. abbr.	3t	Mon 19.11.07	Mit 21.11.07
11	Rinnentrog	2t	Fre 23.11.07	Mon 26.11.07
12	Verbunddecke	3t	Don 22.11.07	Mon 26.11.07
13	Vorb. f. prov. Abd.	3t	Mit 28.11.07	Fre 30.11.07
14	Prov. Abdichtung	2t	Mon 03.12.07	Die 04.12.07
15	Prov.Abd. fertig	0t	Die 04.12.07	Die 04.12.07
16	Dach abbrechen	5t	Mit 05.12.07	Die 11.12.07
17	Mwk. abbrechen	4t	Die 11.12.07	Fre 14.12.07
18	Verb.d.-Erg.Roste	2t	Mon 17.12.07	Die 18.12.07
19	Stahlkonstruktion	5t	Don 10.01.08	Mit 16.01.08
20	Holzbalkendecke	5t	Mon 14.01.08	Fre 18.01.08
21	Mwk. neu - 1.DG	3t	Mit 19.12.07	Fre 21.12.07
22	STB-Roste - 1.DG	3t	Mon 07.01.08	Mit 09.01.08
23	STB-Decke ü. 1.DG	5t	Mit 19.12.07	Die 08.01.08
24	Mwk. neu - 2.DG	2t	Mit 09.01.08	Don 10.01.08
25	STB-Rost - 2.DG	2t	Fre 11.01.08	Mon 14.01.08
26	Dachkonstruktion	10t	Don 17.01.08	Mit 30.01.08
27	Dachkonstr.-Ergänz.	3t	Mon 11.02.08	Mit 13.02.08
28	U-Konstr.Beschatt.	1t	Don 17.01.08	Don 17.01.08
29	Dachdeckung	20t	Don 31.01.08	Mit 27.02.08
30	Fensterband	5t	Don 14.02.08	Mit 20.02.08
31				
32	**DG-DIEF-Innenausbau**	**80t**	**Don 14.02.08**	**Don 12.06.08**
33	Schächte 3-seit.	3t	Don 14.02.08	Mon 18.02.08
34	Metallschornsteine	3t	Die 19.02.08	Don 21.02.08
35	Schächte schliessen	3t	Fre 22.02.08	Die 26.02.08
36	Wohn.trennw.+Dachschr	10t	Mit 27.02.08	Die 11.03.08
37	Trennw. 1-seit.	8t	Mit 05.03.08	Fre 14.03.08
38	Rohinstallation	8t	Mit 12.03.08	Fre 21.03.08
39	Trennw.schließen	3t	Die 25.03.08	Don 27.03.08
40	Rohinst.Fußboden	5t	Fre 28.03.08	Don 03.04.08
41	Estrich	10t	Fre 04.04.08	Don 17.04.08
42	Estrich DG-Dief.-fertig	0t	Don 17.04.08	Don 17.04.08
43	Fliesenleger	8t	Die 06.05.08	Fre 16.05.08
44	Maler	8t	Fre 09.05.08	Mit 21.05.08
45	Holzfußböden	7t	Mon 26.05.08	Die 03.06.08
46	Treppen	2t	Don 29.05.08	Fre 30.05.08
47	Innentüren	2t	Mit 04.06.08	Don 05.06.08
48	Komplettierung	5t	Fre 06.06.08	Don 12.06.08
49				
50	**DG-Ortnergasse**	**44t**	**Die 11.03.08**	**Don 15.05.08**
51	Rinnentrog	2t	Die 11.03.08	Mit 12.03.08
52	Prov. Abdichtung-Erg.	1t	Fre 14.03.08	Fre 14.03.08
53	Dach abbrechen	4t	Mon 17.03.08	Don 20.03.08
54	Mwk. abbrechen	4t	Don 20.03.08	Mit 26.03.08
55	Verb.d.-Erg.Roste	2t	Don 27.03.08	Fre 28.03.08
56	Stahlkonstruktion	7t	Fre 04.04.08	Mon 14.04.08
57	Holzbalkendecke	4t	Fre 11.04.08	Mit 16.04.08
58	Mwk. neu - 1.DG	3t	Mon 31.03.08	Mit 02.04.08
59	STB-decke+Roste 1.DG	2t	Don 03.04.08	Fre 04.04.08
60	Mwk. neu - 2.DG	2t	Mon 07.04.08	Die 08.04.08
61	STB-Rost - 2.DG	2t	Mit 09.04.08	Don 10.04.08
62	Dachkonstruktion	10t	Die 15.04.08	Mon 28.04.08
63	U-konstr.Beschatt.	1t	Die 15.04.08	Die 15.04.08
64	Dachdeckung	15t	Die 22.04.08	Don 15.05.08
65	Fensterband	5t	Die 29.04.08	Mit 07.05.08
66				
67	**DG-ORT-Innenausbau**	**80t**	**Die 29.04.08**	**Die 26.08.08**
68	Schächte 3-seit.	3t	Die 29.04.08	Mon 05.05.08
69	Metallschornsteine	3t	Die 06.05.08	Don 08.05.08
70	Schächte schliessen	3t	Fre 09.05.08	Mit 14.05.08
71	Wohn.trennw.+Dachschr	10t	Don 15.05.08	Fre 30.05.08
72	Trennw. 1-seit.	8t	Mon 26.05.08	Mit 04.06.08
73	Rohinstallation	8t	Mon 02.06.08	Mit 11.06.08
74	Trennw.schließen	3t	Don 12.06.08	Mon 16.06.08
75	Rohinst.Fußboden	5t	Die 17.06.08	Mon 23.06.08
76	Estrich	10t	Die 24.06.08	Mon 07.07.08
77	Estrich DG-Dief.-fertig	0t	Mon 07.07.08	Mon 07.07.08
78	Fliesenleger	8t	Die 22.07.08	Don 31.07.08
79	Maler	8t	Fre 25.07.08	Die 05.08.08
80	Holzfußböden	7t	Mit 06.08.08	Don 14.08.08
81	Treppen	2t	Mon 11.08.08	Die 12.08.08
82	Innentüren	2t	Mon 18.08.08	Die 19.08.08
83	Komplettierung	5t	Mit 20.08.08	Die 26.08.08
84				
85	**Innenhof-Zubau**	**32t**	**Mon 19.11.07**	**Die 15.01.08**
86	Abbrucharbeiten	2t	Mon 19.11.07	Die 20.11.07
87	HDBV-1.Teil	3t	Mit 21.11.07	Fre 23.11.07
88	HDBV-2.Teil	3t	Die 27.11.07	Don 29.11.07
89	Voraushub	1t	Mon 26.11.07	Mon 26.11.07
90	Erdaushub+Pölz.	2t	Die 04.12.07	Mit 05.12.07
91	Bodenplatte-Lift	2t	Don 06.12.07	Fre 07.12.07
92	STB-Wände- Lift	3t	Mon 10.12.07	Mit 12.12.07
93	Abdichtung-Liftw.	1t	Fre 14.12.07	Fre 14.12.07
94	Hinterfüllen	1t	Mon 17.12.07	Mon 17.12.07
95	Bodenplatte	3t	Die 18.12.07	Don 20.12.07
96	Mauerwerk-EG	2t	Fre 21.12.07	Mon 07.01.08
97	DüEG	4t	Die 08.01.08	Fre 11.01.08
98	Brüstung	2t	Mon 14.01.08	Die 15.01.08
99	Rohbau-fertig	0t	Die 15.01.08	Die 15.01.08
100				
101	**Zubauten 1.OG-1.DG**	**54t**	**Mon 14.01.08**	**Fre 28.03.08**
102	Mauerwerk 1.OG	2t	Mon 14.01.08	Die 15.01.08
103	Decke ü.1.OG	3t	Mit 16.01.08	Fre 18.01.08
104	Mauerwerk 2.OG	2t	Mon 21.01.08	Die 22.01.08
105	Decke ü.2.OG	3t	Mit 23.01.08	Fre 25.01.08
106	Mauerwerk 3.OG	2t	Mon 28.01.08	Die 29.01.08
107	Decke ü.3.OG-Dief	3t	Mit 30.01.08	Fre 01.02.08
108	Mwk. Dief. 1.DG	2t	Mon 04.02.08	Die 05.02.08
109	Decke ü. 1.DG-Dief	3t	Mit 06.02.08	Fre 08.02.08
110	Decke ü.3.OG-Ort.	2t	Don 27.03.08	Fre 28.03.08
111				
112				
113	**STB-WS KG-3.OG**	**79t**	**Mon 19.11.07**	**Don 20.03.08**
114	Abbruch Kellerdecke	2t	Mon 19.11.07	Die 20.11.07
115	Aushub	3t	Mit 21.11.07	Fre 23.11.07
116	Fundamente	3t	Mon 26.11.07	Mit 28.11.07
117	Wände im Keller	3t	Don 29.11.07	Mon 03.12.07
118	D.ü.Keller	5t	Die 04.12.07	Mon 10.12.07
119	Wände im EG	3t	Die 11.12.07	Don 13.12.07
120	D.ü.EG-Schliessen	1t	Fre 14.12.07	Fre 14.12.07
121	Wände im 1.OG	3t	Mon 17.12.07	Mit 19.12.07
122	D.ü.1.OG-Schliessen	1t	Don 20.12.07	Don 20.12.07
123	Wand im 2.OG-Dief.	3t	Fre 21.12.07	Die 08.01.08
124	D.ü.2.OG-Dief.-Schl.	1t	Mit 09.01.08	Mit 09.01.08
125	Wand Dief.bachg. im 3.OG	1t	Don 10.01.08	Don 10.01.08
126	D.ü.3.OG-Dief.-Schl.	1t	Fre 11.01.08	Fre 11.01.08
127	Wand im 2.OG-Ort.	3t	Die 11.03.08	Don 13.03.08
128	D.ü.2.OG-Ort.-Schl.	1t	Fre 14.03.08	Fre 14.03.08
129	Wand im 3.OG-Ort	3t	Mon 17.03.08	Mit 19.03.08
130	D.ü.3.OG-Ort.-Schl.	1t	Don 20.03.08	Don 20.03.08
131				
132				
133	**Adapt. NATURFREUNDE**	**117t**	**Don 29.11.07**	**Mon 02.06.08**
134	Umsied. in die Ort.gasse	3t	Don 29.11.07	Die 04.12.07
135	Vorbereit. Dief.gasse	5t	Die 04.12.07	Mon 10.12.07
136	Rohbau Dief.Beginn	0t	Fre 21.12.07	Fre 21.12.07
137	Rohbau Dief.Ende	0t	Fre 08.02.08	Fre 08.02.08
138	Dach Dief. dicht	0t	Mit 13.02.08	Mit 13.02.08
139	Fenster Dief.	3t	Don 24.01.08	Mon 28.01.08
140	Innenausbau	40t	Don 10.01.08	Mit 05.03.08
141	Umsied.in die Dief.gasse	3t	Don 06.03.08	Mon 10.03.08
142	Rohbau Ort.Beginn	0t	Die 11.03.08	Die 11.03.08
143	Rohbau Ort. Ende	0t	Fre 04.04.08	Fre 04.04.08
144	Dach Ort. dicht	0t	Mit 07.05.08	Mit 07.05.08
145	Fenster Ort.	3t	Die 29.04.08	Mon 05.05.08
146	Innenausbau	30t	Die 15.04.08	Mon 02.06.08
147				
148	**Wohnungen Bestand**	**160t**	**Mon 19.11.07**	**Mon 21.07.08**
149	Abbrucharbeiten	45t	Mon 19.11.07	Fre 01.02.08
150	Konstr. Arbeiten	90t	Mon 10.12.07	Mon 28.04.08
151	Fenster	10t	Mon 18.02.08	Fre 29.02.08
152	Innenausbau	120t	Mon 28.01.08	Mon 21.07.08
153				
154	**Strassenfassade**	**120t**	**Don 29.11.07**	**Don 05.06.08**
155	Passagegerüst	115t	Don 29.11.07	Don 29.05.08
156	Fassadengerüst	110t	Mon 03.12.07	Mon 26.05.08
157	Fassade 1.OG-3.OG	55t	Don 28.02.08	Die 20.05.08
158	Fassade EG	5t	Fre 30.05.08	Don 05.06.08
159	Besch.system	5t	Don 08.05.08	Don 15.05.08
160				
161	**Hoffassade**	**35t**	**Mon 14.04.08**	**Fre 06.06.08**
162	Fassadengerüst	20t	Mon 14.04.08	Mit 14.05.08
163	Fassade	15t	Don 15.05.08	Fre 06.06.08

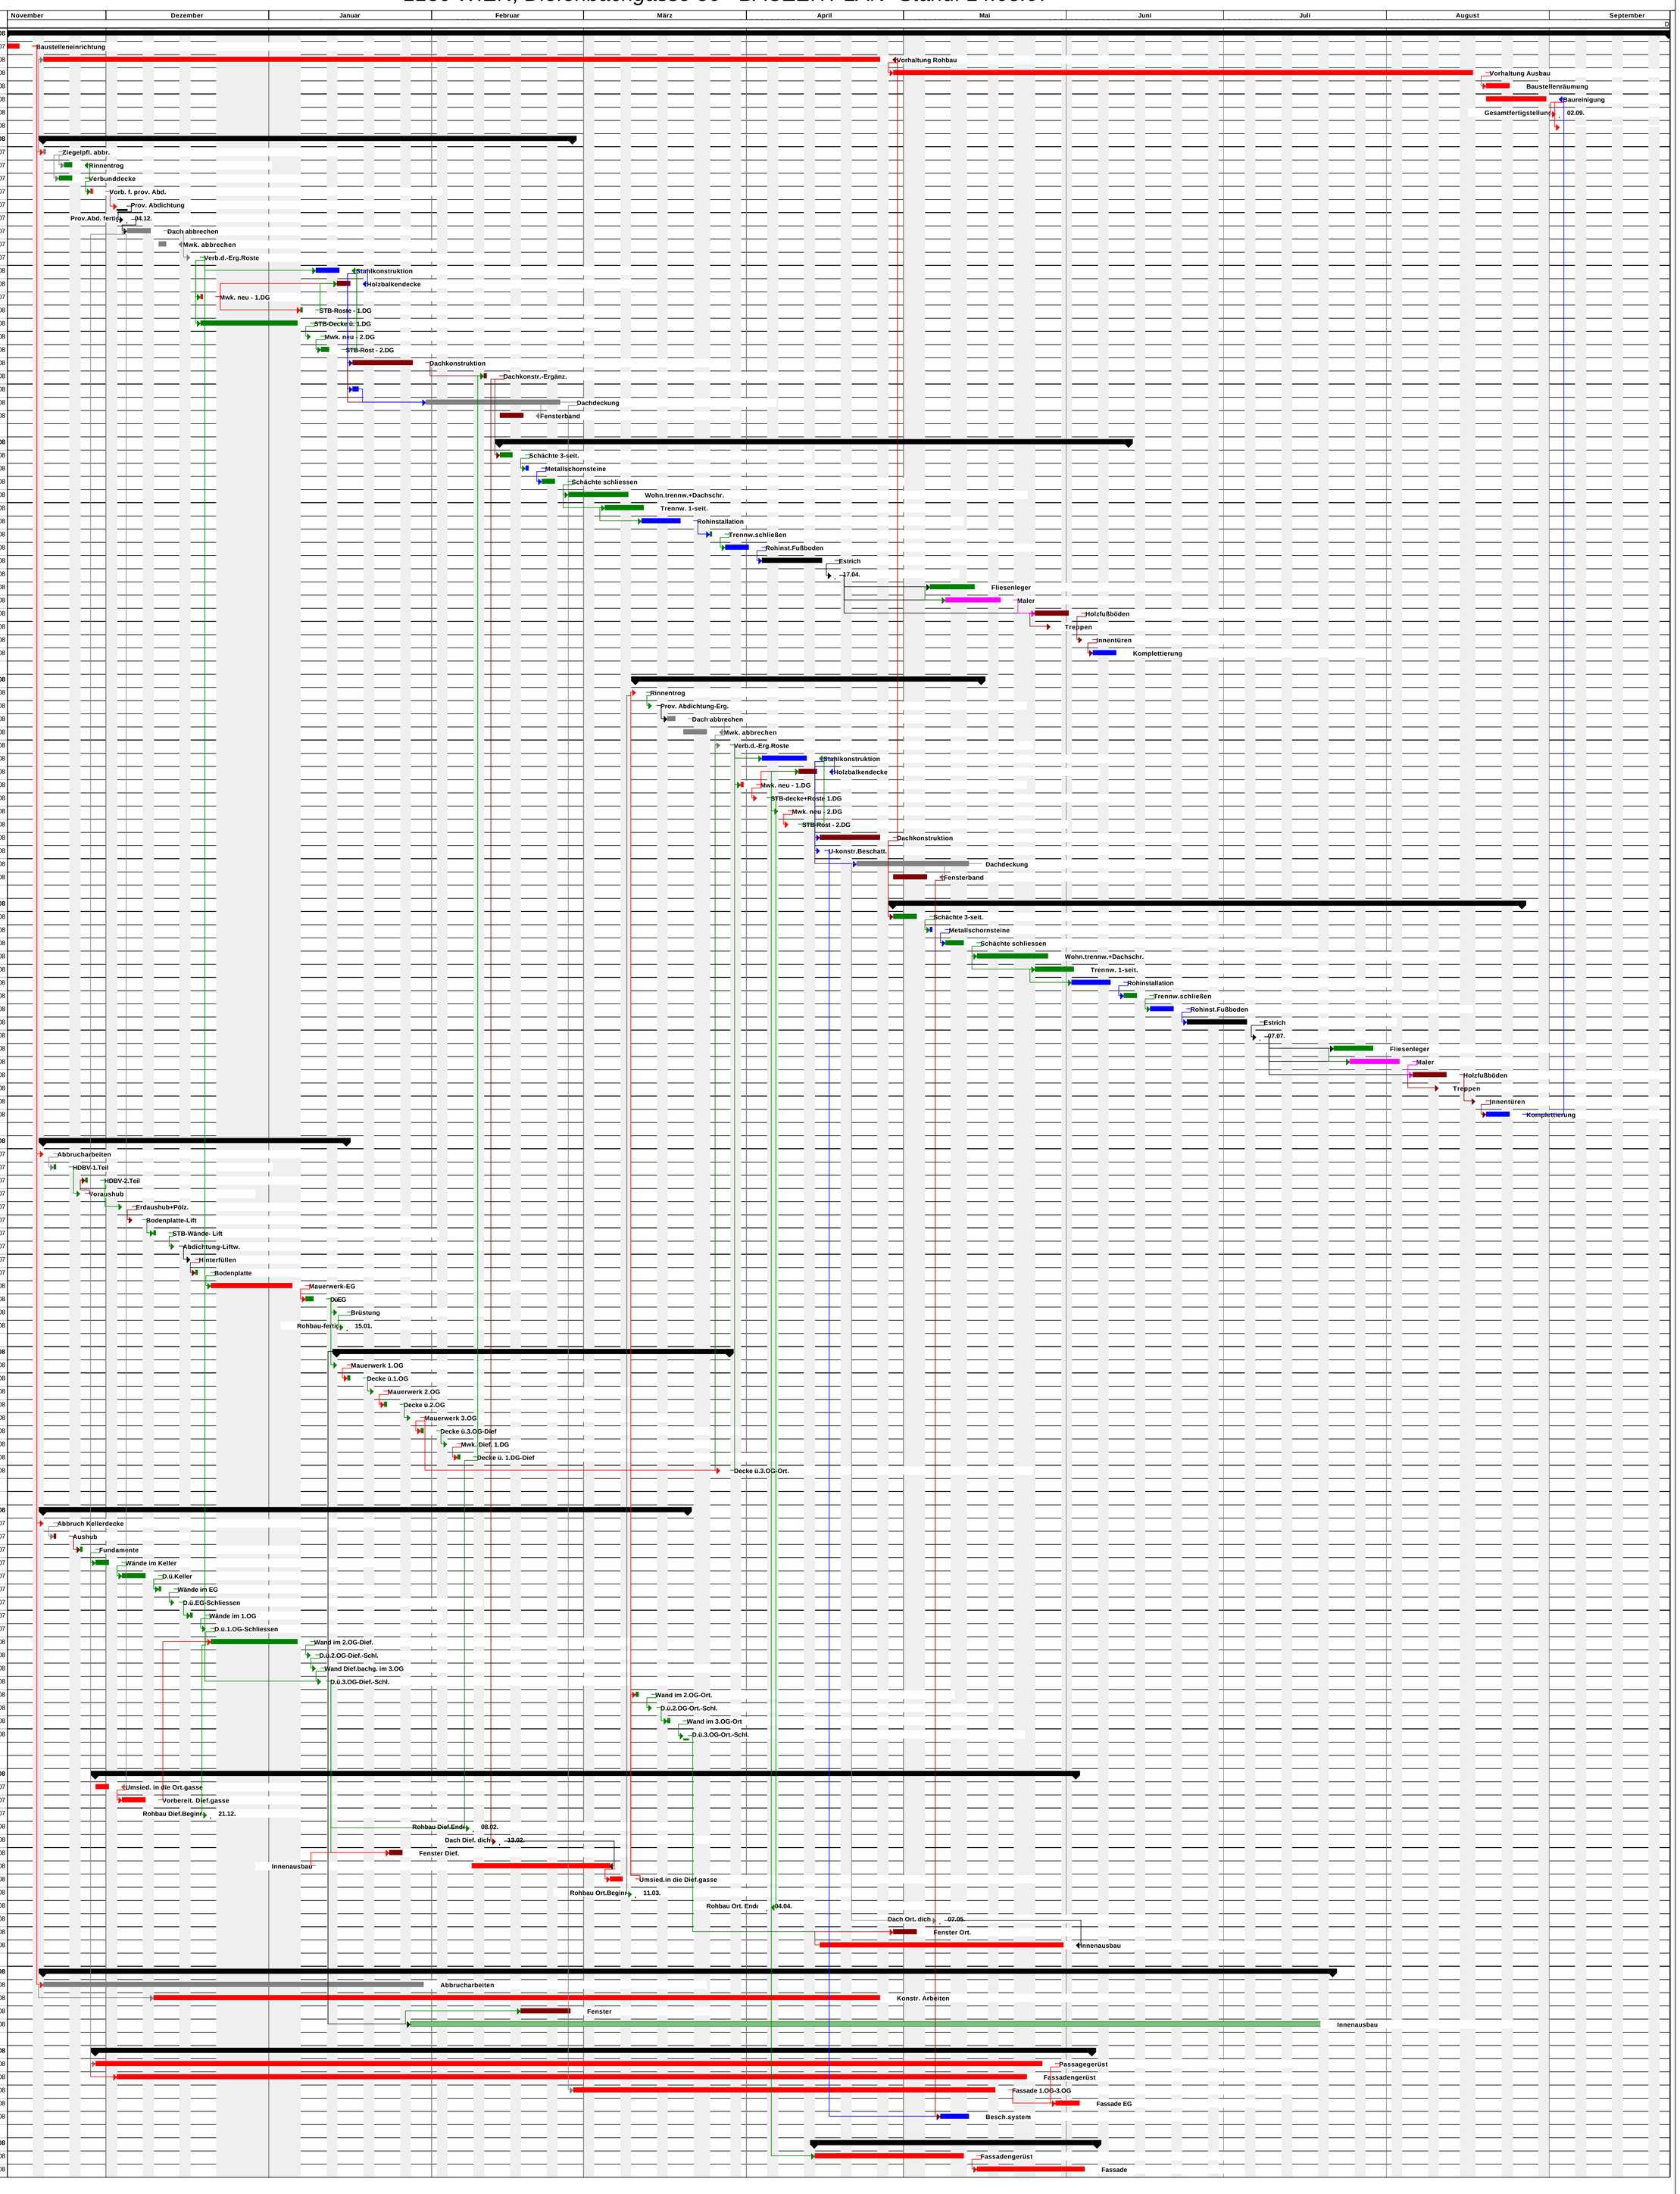

Projekt: Bauzeitplan-07.05.07.mpp
Datum: Die 29.05.07

Vorgang | Fortschritt | Meilenstein | Sammelvorgang | Rollup-Vorgang | Rollup-Meilenstein | Rollup-Fortschritt
